


PTRF NACIONAL (PORT. DG-439/06) - EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS


início: 09/01/2006; prazo previsto: 6 meses (26 semanas)

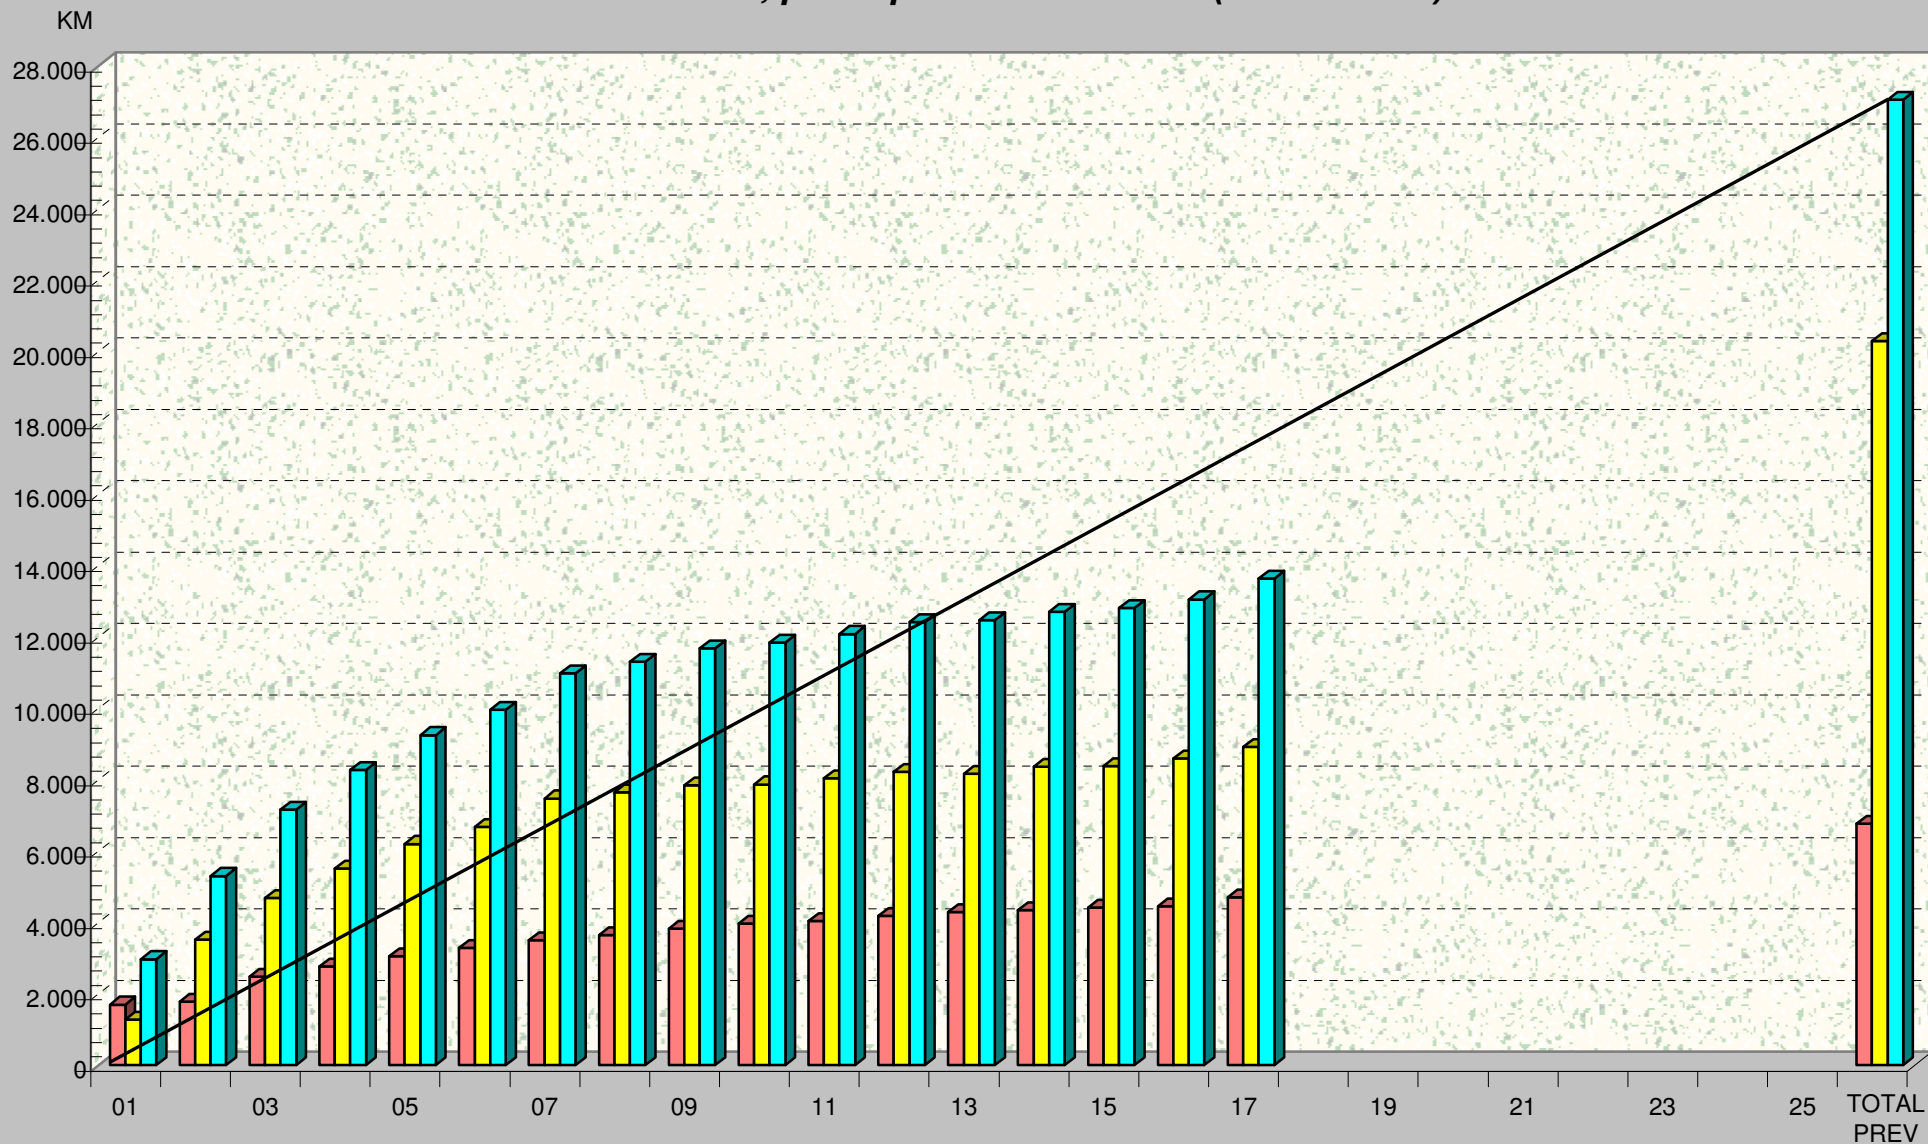

EMERGÊNCIA (ANEXO I) RECUP. ROD. (ANEXO II) TOTAL

CGPLAN / DPP / DNIT

**PTRF NACIONAL (PORT. DG-439/06)
EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ SEMANA 17 (09/01/06 A 04/05/06)**

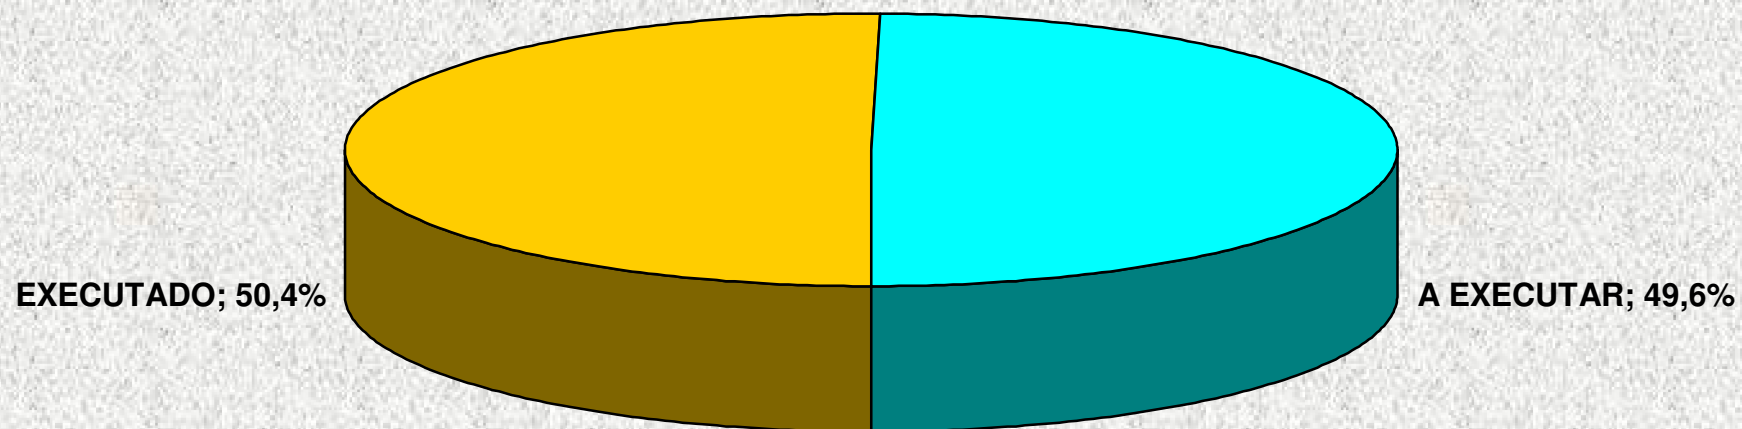

PTRF NACIONAL - EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS - PORT. DG-439/06

EXTENSÃO EXECUTADA ACUMULADA (KM)				% TOT EXEC / TOT PREVIST	% A EXECUTAR
ATÉ SEMANA	EMERGÊNCIA (ANEXO I)	RECUP. ROD. (ANEXO II)	TOTAL		
01	1.702,1	1.274,3	2.976,4	11,0%	89,0%
02	1.782,6	3.523,9	5.306,5	19,6%	80,4%
03	2.480,4	4.686,7	7.167,1	26,5%	73,5%
04	2.776,1	5.508,3	8.284,4	30,6%	69,4%
05	3.049,9	6.205,0	9.254,9	34,2%	65,8%
06	3.286,9	6.678,3	9.965,2	36,8%	63,2%
07	3.508,5	7.477,8	10.986,3	40,6%	59,4%
08	3.648,5	7.657,0	11.305,5	41,8%	58,2%
09	3.825,8	7.852,6	11.678,4	43,1%	56,9%
10	3.971,5	7.873,0	11.844,5	43,8%	56,2%
11	4.040,1	8.048,4	12.088,5	44,7%	55,3%
12	4.191,9	8.226,7	12.418,6	45,9%	54,1%
13	4.300,1	8.176,3	12.476,4	46,1%	53,9%
14	4.353,5	8.361,5	12.715,0	47,0%	53,0%
15	4.422,3	8.388,1	12.810,4	47,3%	52,7%
16	4.461,5	8.597,0	13.058,5	48,2%	51,8%
17	4.711,1	8.926,1	13.637,2	50,4%	49,6%
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
TOTAL PREVIST	6.776,1	20.292,3	27.068,4		

CGPLAN / DPP/ DNIT

EXECUTADO	A EXECUTAR
50,4%	49,6%
